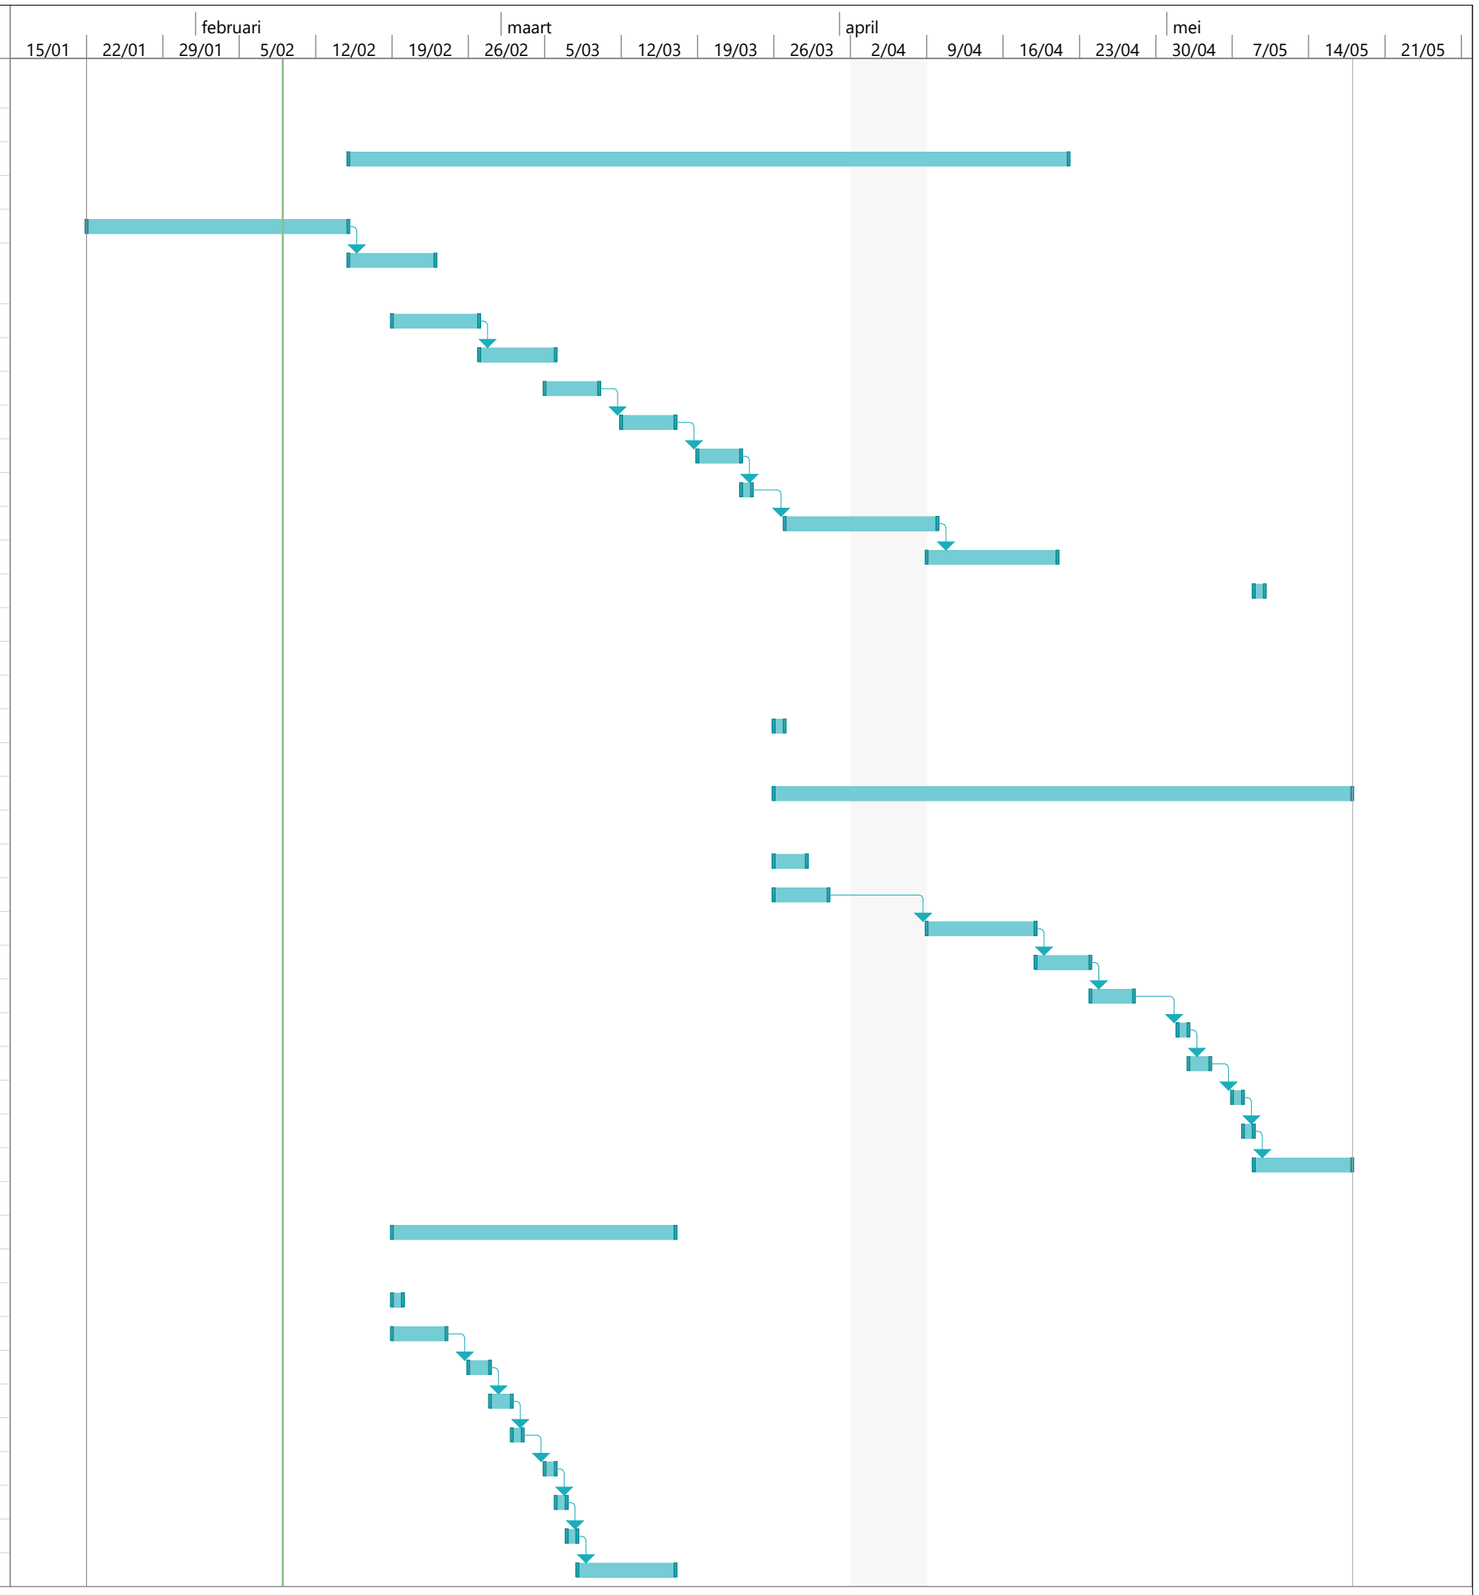Id		Taaknaam	Duur	Begindatum
1		**Planning Steenwinkelstraat**		
2				
3		**Fase 4**	43 dagen	don 15/02/18
4				
5		werken nutsmaatschappijen	18 dagen	maa 22/01/18
6		opbraak gasbuis, grondwerk en onderfundering rijweg	6 dagen	don 15/02/18
7		plaatsen kolken	6 dagen	maa 19/02/18
8		fundering boordstenen onpare zijde	5 dagen	din 27/02/18
9		fundering boordstenen pare zijde	5 dagen	maa 5/03/18
10		ter plaatse storten boordstenen en kantstrook	5 dagen	maa 12/03/18
11		fundering fietspad en rijweg	4 dagen	maa 19/03/18
12		onderlaag asfalt rijweg fase 4	1 dag	vri 23/03/18
13		fietspad pare zijde en onpare zijde fase	5 dagen	din 27/03/18
14		aanleg voetpaden	10 dagen	maa 9/04/18
15		toplaag asfalt	1 dag	woe 9/05/18
16				
17		**Fase 2 en 3**		
18				
19		toplaag asfalt	1 dag	maa 26/03/18
20				
21		**Fase Bist**	30 dagen	maa 26/03/18
22				
23		opbraak fietspad en voetpaden	3 dagen	maa 26/03/18
24		aanleg rioleringen	5 dagen	maa 26/03/18
25		realiseren huisaansluitingen	8 dagen	maa 9/04/18
26		plaatsen kolken	3 dagen	don 19/04/18
27		fundering boordstenen	4 dagen	din 24/04/18
28		ter plaatse storten boordstenen en kantstrook	1 dag	woe 2/05/18
29		fundering fietspad en rijweg	2 dagen	don 3/05/18
30		ter plaatse storten fietspad	1 dag	maa 7/05/18
31		onderlaag en toplaag asfalt rijweg	1 dag	din 8/05/18
32		aanleg voetpaden	5 dagen	woe 9/05/18
33				
34		**Fase Hulstlei**	20 dagen	maa 19/02/18
35				
36		opbraak wegenis	1 dag	maa 19/02/18
37		plaatsen riolering	5 dagen	maa 19/02/18
38		realiseren huisaansluitingen	2 dagen	maa 26/02/18
39		plaatsen kolken	2 dagen	woe 28/02/18
40		fundering boordstenen	1 dag	vri 2/03/18
41		plaatsen boordstenen	1 dag	maa 5/03/18
42		fundering rijweg	1 dag	din 6/03/18
43		asfalt rijweg	1 dag	woe 7/03/18
44		aanleg voetpaden/parkeerstrook	7 dagen	don 8/03/18
